

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 144/SSTYTRA/16**ALTOTE S.A.**

U.T.E.



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Mayo de 2016.

Ing. Guadalupe Rodríguez Marcaida
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
Av Martín García 346
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
S ____ / ____ D

Referencia: Lic. Pub. 2529 / 2013
Expediente 2769136 / 2013
Decreto 142 / 2014
Obra: AMPLIACIÓN DE LA RED PLUVIAL DE
CAPTACION IV
Objeto: Obras en Vía Pública en la calle CABILDO

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente solicitamos el **CIERRE TOTAL** de la calzada, de acuerdo a diagrama del permiso **GDP-27-16**, este tiene su origen en el proyecto de la red pluvial denominado **CABILDO** y afecta en esta oportunidad **la bocacalle de CABILDO y CESPEDES, a partir del día 30/05/16, por un lapso total de 5 días corridos.**

- Se adjuntan croquis del sector de referencia con sus alcances de trabajos.
- Descripción de los trabajos.
- Diagrama de desvío vehicular.
- Croquis de Carteles de tránsito a colocar

Nota: Cantidad de Folios:

Sin otro particular, y agradeciendo su gestión a nuestro pedido, saludamos a ustedes muy atentamente.


Ing. Eduardo Otero Machado
Mat CPIC N° 113.9 - Representante Técnico
ALTOTE SA-NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. - U.T.E.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 144/SSTYTRA/16 (continuación)**ALTOTE S.A.**

U.T.E.



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Mayo de 2016.

Referencia: Lic. Pub. 2529 / 2013
Expediente 2769136 / 2013
Decreto 142 / 2014

Obra: AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL DE
CAPTACION IV

Permiso: **GDP-27-16**

Sector: Obras en Vía Pública en calle CABILDO

Memoria de Trabajos**(30/05/16 al 03/06/16)**

Se efectuarán trabajos en el **frente de trabajo** denominado **CABILDO** y afecta en esta oportunidad la bocacalle de **CABILDO Y CESPEDES** a partir del día **30/05/16**, por un lapso total de 5 días.

Los trabajos a efectuar consistirán en Excavación a 5 m de profundidad en la calzada, para la colocación de caños de gran diámetro para la Obra de Ampliación de la Red Pluvial de Captación de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán máquinas excavadoras de gran porte, camiones para transporte de suelos y materiales para la ejecución de los trabajos. Luego de completado la excavación se colocarán los caños, los nexos y sumideros conectándolos a la red pluvial existente. Por último se ejecutará la reconstrucción de la zona afectada de acuerdo al tipo de pavimento existente en el lugar con la base de hormigón y las especificaciones acordadas según Resolución N° 22-SSA-2004.

Se acompaña los Croquis con la zona de intervención.

Ing. Eduardo Otero Machado
Mat CPIC N° 1.499 - Representante Técnico
ALTOTE SA-NAKU CONSTRUCCIONES SRL-UTE

Arq Guillermo Cappella
Mat CPAU N° 1.886 - Inspección
Dirección Obras de Ingeniería - GCBA


ANEXO - RESOLUCIÓN N° 144/SSTYTRA/16 (continuación)

 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires		FORMULARIO: GDP - 27 - 16	CARACTER: P	EMPRESA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Obra: AMPLIACIÓN DE LA RED PLUVIAL DE CAPTACIÓN IV
---	--	---------------------------	-------------	---	--


N° de Orden Tipo (Nº/GRUP)	Empresa Contratista	Empresa Subcontratista	UBICACIÓN		Sector o manzana	Trabajo	OBRA		TUBERÍA	FECHA			DIMENSIONES				Diámetro N° de Croquis	SOLADO ESPECIAL		
			Calle	Altura			Desde	Hasta		Tipo de Obra	Cantón	Fecha de inicio	Plazo	Largo	Ancho	Profundidad		Tipo	N° de Fictura	N° de Remito
1	N	Altote S.A. - Naku Construcciones S.R.L. U.T.E.	Altote S.A. - Naku Construcciones S.R.L. U.T.E.	CABILDO	1220	1180	C	ZANJA	GRAL	CA		30/05/2016	5	27,92	1,00	5,00		asfalto		
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				

Número de NDTA: N° 15 176 Syp 2005	Número de Resolución: Licitación Pública N° 2529/2013 Exp. 2.769 136/2013	Aseguradora	Poliza	Cuenta
------------------------------------	---	-------------	--------	--------

REPRESENTANTE CONTRATANTE Apellido y Nombre: _____ Firma: _____ Arq. Guillermo Capella Mat. CPAU N° 14386 - Inspección Dirección Obras de Ingeniería GCBA	REPRESENTANTE CONTRATISTA Apellido y Nombre: _____ Firma: _____ Ing. Eduardo Otero Machado Mat. CPIC N° 14472-Rep. Técnico Altote S.A. Naku Constr. S.R.L. U.T.E.	ALTOTE S.A. - NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. U.T.E. TEL. 4553-2600	Observaciones:
--	--	---	----------------

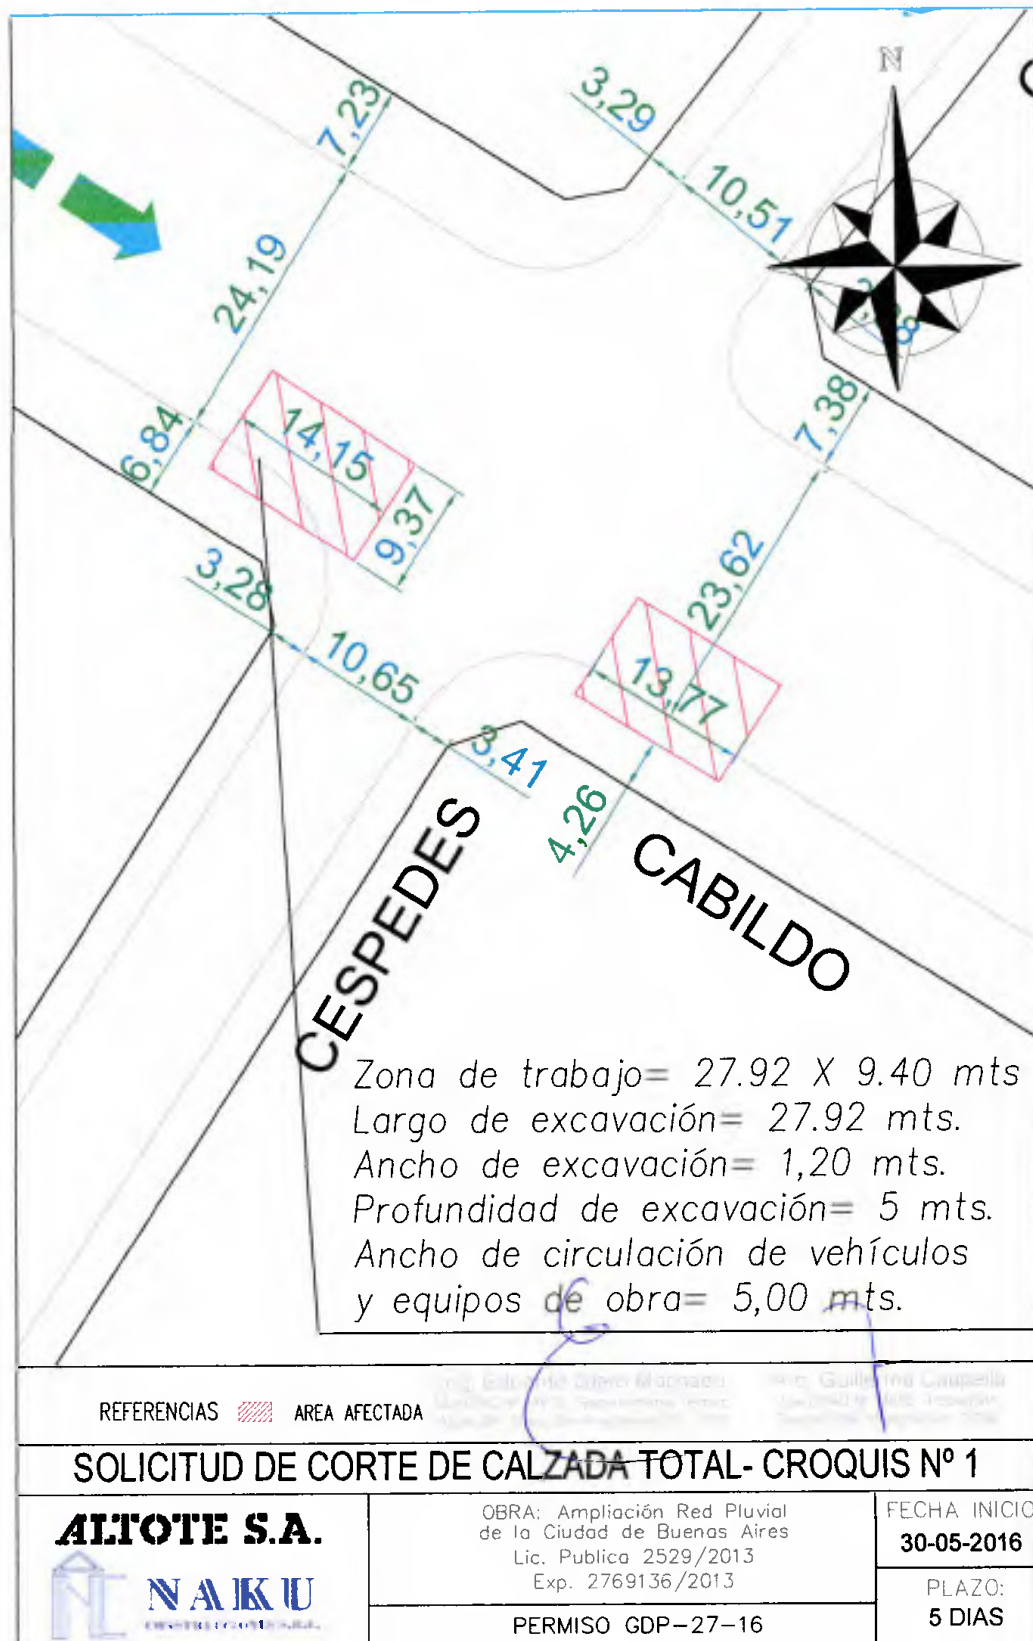ANEXO - RESOLUCIÓN N° 144/SSTYTRA/16 (continuación)


ANEXO - RESOLUCIÓN N° 144/SSTYTRA/16 (continuación)

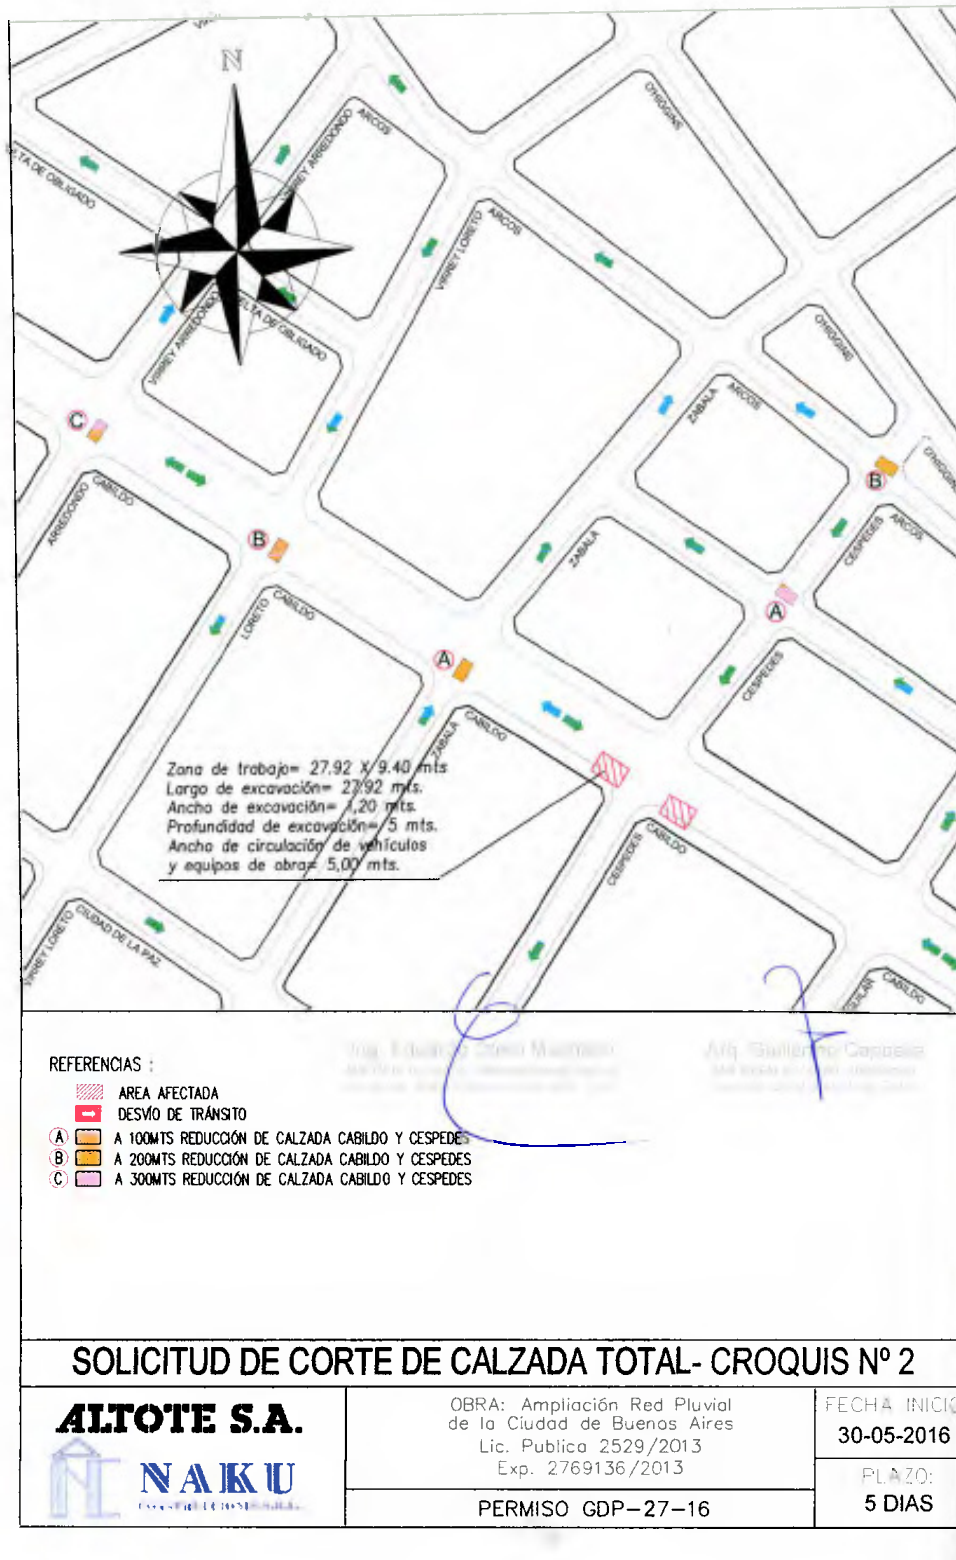


ANEXO - RESOLUCIÓN N° 144/SSTYTRA/16 (continuación)

CARTELES DE DESVIO


A CARTEL A COLOCAR EN
CABILDO Y ZABALA
CESPEDES Y V DE OBLIGADO



B CARTEL A COLOCAR EN
CABILDO Y V. LORETO
ARCOS Y CESPEDES



C CARTEL A COLOCAR EN
CABILDO Y V. ARREDONDO



Eduardo Gerardo Washnitsky
Ingeniero de Tránsito - Especialista en Tránsito

Guillermo Cappellari
Ingeniero de Tránsito - Especialista en Tránsito

CARTELES DE DESVIO DE TRÁNSITO - CROQUIS N° 3

ALTOTE S.A.  NAKU CONSTRUCCIONES S.A.	OBRA: Ampliación Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires Lic. Publica 2529/2013 Exp. 2769136/2013	FECHA INICIO: 30-05-2016
	PERMISO GDP-27-16	PLAZO: 5 DIAS

FIN DEL ANEXO
